



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Projekt je spolufinancován z EU.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Libina

se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina

zastoupená: Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta obce

IČ: 00302899

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta obce

bankovní spojení: ČSO a.s. pobočka Šumperk

číslo účtu: 188244719 kód banky: 0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost: STAVBY RIO spol. s r.o.

Se sídlem: třída Hrdinů 682/29, 795 01 Rýmařov

Zastoupená: Davidem Zábranským, jednatelem

IČ: 25826697

DIČ: CZ25826697

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech smluvních: David Zábranský, Miloslav Vopařil

- Ve věcech technických: Patrik Krečmer, Miloslav Vopařil

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 3633340359/0800

Tel. +420 777 644 208

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat

za objednatele: Mgr. Ing. Tomáš Kobza, Ing. Petr Knápek – TDI, tel.č. 605265754

za zhotovitele: Miloslav Vopařil tel. č. 606422505

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. Základní údaje o díle

Název stavby: **Zateplení ZŠ Libina č.p. 520**

2.1. Adresa stavby: budova ZŠ v Libině na adrese: Libina č.p 520, parc. č. st. 514, kú Horní Libina

3. Předmět plnění

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě dodatečného zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří v obvodovém plášti, dodatečné zateplení podlah půdního prostoru a rekonstrukce kotelny a výměna radiátorů ÚT na budově Základní Školy. Práce budou probíhat v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce "**Zateplení ZŠ Libina č.p. 520**", dále výkazem výměr, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Předpokládané zahájení prací je **1. května 2015**.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **31. července 2015**.

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatелеm, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí bez rezervy ve výši 5% z ceny bez DPH činí:

Cena bez DPH	2.075.207,- Kč
Výše DPH (21%)	435.794,- Kč



Cena včetně DPH

2.511.001,- Kč

- 6.2.** Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3.** Rezerva ve výši 5% z ceny bez DPH (celkem 103.760,- Kč bez DPH) bude sloužit výhradně k úhradě nákladů, které se vyskytly v průběhu realizace díla, a které nebylo možno předem předvídat, tj. nebyly zahrnuty v ceně díla dle výkazu výměr, ale jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Rezerva může být čerpána pouze na základě odsouhlaseného a statutárními zástupci obou smluvních stran podepsaného změnového listu jež bude vyhotoven postupem zadavatele v souladu s ust. §23 odst.7 Zákona, a který bude následně předložen k odsouhlasení poskytovateli dotace.
- 6.4.** Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
- 6.5.** V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.6.** Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případech:
- a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
- Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.7.** Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.6. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.8.** Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.7. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů, který bude obsahovat zejména

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatel vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelům vrácena.

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Pro zajištění závazků spojených s odstraňováním závad zjištěných při předání hotové stavby zadavateli nebo v průběhu záruční doby díla, předá dodavatel, se kterým má být podepsána smlouva o dílo, Zadavateli **bankovní záruku ve výši 5% celkové ceny** této zakázky bez DPH. Bankovní záruka (originál) bude zadavateli předána před podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude dodavateli vrácena do 14-ti dnů po odstranění případných vad a nedodělků, nejdříve však do 14-ti dnů po uplynutí záruční doby. Před podpisem smlouvy o dílo předá dodavatel zadavateli příslib banky o poskytnutí této záruky. Doba platnosti bankovní záruky bude min. 60 kalendářních dní po termínu uplynutí záruční doby.

7.4. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení Faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelům,



- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

V případě, že stavba je financována z dotace, musí být na faktuře kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z dotačního titulu – text: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Zateplení ZŠ Libina č.p. 520“, hrazeného z dotace OPŽP“.

- 7.5.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.6.** Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je buď jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
- 7.7.** Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.
- 7.8.** Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 7.9.** Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
- 7.10.** Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.11.** Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.12.** Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla

- 8.1.** Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a



rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 8.2.** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník.
- 8.3.** Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4.** Objednatel vykonává na stavbě technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5.** Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6.** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8.** Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.9.** Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

a norem o požární ochraně.

- 8.12.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřipustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14.** V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

- 9.1.** Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2.** O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3.** Při jednání o předání staveniště objednatel za úplatu předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4.** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6.** Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7.** Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1.** K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení převjímacího řízení. K termínu zahájení převjímký předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,



- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
- dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.

11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit,



pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

- 11.7.** Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9.** Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **20.000,- Kč** (dvacetisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.2.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.3.** Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6 této Smlouvy ve výši **10.000,- Kč** (desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.3.** Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.
- 12.4.** V případě že vinou zhotovitele, například při nedodržení lhůt, dojde ke zkrácení nebo odebrání dotace, je zhotovitel povinen tuto ztrátu nahradit.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1.** Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2.** Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když



zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

13.5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

14.7. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.

- 14.8.** Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.
- 14.9.** Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.10.** Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Úřadu pro hospodářskou soutěž nebo zástupců Evropské komise předložit veškeré doklady týkající se této zakázky dle této Smlouvy, a to v době 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že po dobu 10 let po termínu předání a převzetí díla objednatelem, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a násl. Nařízení (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, bude řádně archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla dle této Smlouvy (zejména smlouvy, zápisy, stavební deník, apod.).
- 14.11.** Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 14.12.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění částí veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, předloží Zhotovitel seznam subdodavatelů v kalendářním roce do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
- 14.13.** Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 14.14.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění částí veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 15.2.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 15.3.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.4.** Smlouva je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.5.** Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích příloh na Profilu zadavatele Obce Libina.
- 15.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

Smlouva byla schválena Radou obce Libina na schůzi konané dne 11. 3. 2015 usnesením č.j. 9.2.4.

V Libině dne 23. 03. 2015
Objednatel:

V Libině dne 23. 03. 2015
Zhotovitel:

OBEC
LIBINA
PSČ 788 03 2
IČ: 00362836

Mgr. Ing. Tomáš Kobza
starosta obce

STAVBY RIO spol. s r.o.
třída Hrdinů 682/29 | Rýmařov
IČ 25826697 / DIČ CZ25826697

Miloslav Vopařil
jednatel společnosti


**Akce : Zateplení ZŠ Libina č.p. 520
parc.č. 514, kú Horní Libina**

Investor : Obec Libina, Libina 523, 788 05 Libina
IČO: 302899

SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

	cena bez DPH	DPH	cena vč.DPH
ST13-19-1 Objekt ZŠ-zateplení	1.562.055	328.032	1.890.087 Kč
ST13-19-2 Kotelna na tuhá pal. výměna radiátorů ÚT	498.355	104.655	603.010 Kč
ST13-19-1 Dodatek č. 1	14.797	3.107	17.904 Kč
Celkem	2.075.207	435.794	2.511.001 Kč

STAV/STAVOP spol. s r.o.
IČO 284 401 512/26 | Pýsmův
Libina 523 788 05



rozpočet stavby

Datum: 17.2.2015

Stavba : ST13-19-1

ZATEPLENÍ ZS LIBINA C.P.520

Objednatel : OBEC LIBINA
LIBINA 523

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : STAVBY RIO, spol. s r.o.
Tř. Hrdinů 29
Rýmařov

IČO : 25826697
DIČ : CZ25826697

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 562 055,00
DPH	21 %		328 032,00
Cena celkem za stavbu			1 890 087

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	1 865 887	0	1 542 055	323 832	98,7
02 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	24 200	0	20 000	4 200	1,3
Celkem za stavbu	1 890 087	0	1 562 055	328 032	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
	13-19-1 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	1 865 887	0	1 542 055	323 832	98,7
02	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	24 200	0	20 000	4 200	1,3
	Celkem za stavbu	1 890 087	0	1 562 055	328 032	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,0	200	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	300	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	6,3	98 048	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	38,7	604 749	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3,0	47 499	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	4,5	0	70 233	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	2,6	0	40 016	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	4,0	0	62 551	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	7,5	0	117 809	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	22,9	0	356 967	0	0	0
783 Nátěry	0,4	0	6 653	0	0	0
784 Malby	0,3	0	4 410	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3,2	50 023	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	5 007	0	0	0	0

96	Bourání konstrukcí	0,7	10 547	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,5	7 098	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,9	14 784	0	0	0	0
991	Vedlejší rozpočtové náklady	1,3	20 000	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,6	25 161	0	0	0	0
M11	Hromosvody	0,3	0	0	0	5 000	0
M21	Elektromontáže	1,0	0	0	0	15 000	0
Celkem za stavbu		100,0	883 416	658 639	0	20 000	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

ROZPOČET

Rozpočet	13-19-1	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	JKSO	
Objekt			SKP	
01		OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ST13-19-1		ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Náklady na m.j.	0
Projektant		STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		OBEC LIBINA		
Dodavatel		STAVBY RIO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	863 416	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	658 639	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 542 055	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 542 055	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 542 055	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 542 055 Kč
DPH			21,0 %	323 832 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 865 887 Kč

Poznámka :

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet : 13-19-1
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	200	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	300	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	98 048	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	604 749	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	47 499	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	50 023	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 007	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 547	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 098	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 784	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	70 233	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	40 016	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	62 551	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	117 809	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	356 967	0	0	0
783 Nátěry	0	6 653	0	0	0
784 Malby	0	4 410	0	0	0
M11 Hromosvody	0	0	0	5 000	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	15 000	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	25 161	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	863 416	658 639	0	20 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,20	1 000,00	200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				200,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				300,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	88,20	100,00	8 820,00
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	88,20	200,00	17 640,00
5	612451264R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, do černa pálená	m2	2,50	200,00	500,00
6	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	33,14	150,00	4 971,53
7	Rozpočet	Okap chodník, venkovní rozpočet	Kč	1,00	66 116,00	66 116,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				98 047,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	601019187RT4	Omítka podhledů silikátová tenkovrstvá zatíraná, zrno 1,5 mm	m2	38,61	180,00	6 949,80
9	601019191R00	Podkladní nátěr podhledu pod tenkovrstvé omítky	m2	38,61	20,00	772,20
10	602014101RT3	Postřík cementový ručně spotřeba 8 kg/m2 - plné pokrytí	m2	41,07	50,00	2 053,50
11	602019187RT4	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová zatíraná, zrno 1,5 mm na KZS	m2	640,36	180,00	115 264,80
12	602019191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	1 270,49	10,00	12 704,90
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	101,91	20,00	2 038,26
14	621142001U00	Potažení vně podhl sklovl síť +Imel	m2	38,61	150,00	5 791,50
15	621421132R00	Omítka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	38,61	50,00	1 930,50
16	622323013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	83,26	60,00	4 995,60
17	622323134RV1	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	607,47	540,00	328 033,80
18	622323153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	26,10	450,00	11 745,00
19	622323734RV1	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,79	680,00	4 617,20
20	622403131U00	Sokl - zavěšený cihelný obklad - lišty kov přír	m2	41,07	1 450,00	59 551,50
21	622403211U00	Sokl - zavěš cihel obklad - roh vnější lišt kov90°	m	3,30	950,00	3 135,00
22	622403231U00	Sokl - zavěš cih obkl - roh vnitř lišt kov90°	m	1,10	950,00	1 045,00
23	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	630,13	50,00	31 506,50
24	622621001U00	Lepení profil v-15 fasáda stěna	m	7,90	250,00	1 975,00
25	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	630,13	10,00	6 301,30
26	R-položka	Provětrávací síť proti hmyzu	m	173,52	25,00	4 338,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				604 749,36
Díl: 64		Výplně otvorů				
27	648991113R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm	m	49,79	100,00	4 979,00
28	60780019	Parapet interiér laminovaná DVT š. 600 mm s nosem	m	1,02	600,00	611,10
29	60780050	Krytka boční pro parapet šíře 200 mm - pár	kus	30,00	30,00	900,00
30	607800270	Parapet interiér laminovaná DVT š. 800 mm s nosem	m	51,26	800,00	41 008,80
	Celkem za	64 Výplně otvorů				47 498,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
31	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	613,45	30,00	18 403,56
32	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 227,00	15,00	18 405,00
33	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	613,45	20,00	12 269,00
34	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,50	100,00	350,00
35	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	7,00	60,00	420,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,50	50,00	175,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				50 022,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952902110R00	Čištění zamestáním v místnostech a chodbách	m2	341,66	4,50	1 537,47
38	952903001U00	Odstranění holub trusu z podlahy	m2	341,66	4,30	1 469,14
39	953941421R00	Osazení loga o ploše nad 0,10 m2	kus	2,00	500,00	1 000,00
40	953942627R00	Osazování praporových konzol	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 006,61
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
41	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5,00	10,00	50,00
42	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	27,00	10,00	270,00
43	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 včetně parapetů	m2	1,69	100,00	169,00
44	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 včetně parapetů a zákrytů radiátorů	m2	90,86	100,00	9 085,80
45	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	3,00	10,00	30,00
46	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,43	100,00	942,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 547,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				
47	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	668,74	10,00	6 687,40
48	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	41,07	10,00	410,70
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 098,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	73,92	200,00	14 784,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 784,32
Díl: 713		Izolace tepelné				
50	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	341,66	30,00	10 249,80
51	713141221RK5	Montáž parozábrany, strop přelep. spojuj. vč. parozábrany	m2	341,66	25,00	8 541,50
52	765901101R00	Fólie podstřešní difuzní	m2	276,86	35,00	9 690,10
53	63150838.A	Plst' nekaširovaná skleněná tl. 200mm skupina tepelné vodivosti 039	m2	348,49	115,00	40 076,72
54	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,35	500,00	1 674,87
	Celkem za	713 Izolace tepelné				70 232,99
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
55	762429001U00	Mtž podkladový rošt	m	184,20	20,00	3 684,00
56	762511267U00	Podlaha OSB 3N tl. 25 mm P+D šroub	m2	64,80	270,00	17 496,00
57	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	24,00	60,00	1 440,00
58	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	24,00	60,00	1 440,00
59	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	2,27	500,00	1 135,30
60	60512680	Fošna SM/BO l.jak tl.30-60mm dl. do 3m š. do 120mm	m3	0,47	4 500,00	2 099,70
61	60515750	Hranol SM/BO profil do 100x100 mm dl. do 4 m	m3	0,17	4 500,00	777,60
62	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	49,68	220,00	10 929,60
63	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,03	500,00	1 013,92
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				40 016,12
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
64	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	52,25	20,00	1 045,00
65	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	90,00		
66	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	89,30	50,00	4 465,00
67	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	89,30	20,00	1 786,00
68	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	49,79	20,00	995,80
69	764421240R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm	m	85,80	200,00	17 160,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	41,50	50,00	2 075,00
71	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	41,50	20,00	830,00
72	764928105R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330	m	49,79	270,00	13 443,30
73	55342095	Parapet vnější hliníkový bílý š 360 mm řezaný	m	54,77	350,00	19 169,15
74	55342125	Krytka hliníková boční po omítce B404 Al 195-360mm	kus	60,00	20,00	1 200,00
75	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,76	500,00	381,85
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				62 551,10
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
76	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	10,00	100,00	1 000,00
77	R-položka	Okenní mříže	m2	0,42	2 381,00	1 000,02
78	R-položka	Hliníkové dveře komaxit vstupní U=1,2 prosklené neprůhledným,kování dle pož.zprávy-předběžná cena	m2	2,10	11 500,00	24 150,00
79	R-položka	Ocelové okno zaskleno drátosklem	m2	0,42	9 500,00	3 990,00
80	R-položka	Hliníkové dveře komaxit vstupní U=1,2 prosklené neprůhledným,kování dle pož.zprávy-předběžná cena	m2	4,73	11 500,00	54 337,50
81	R-položka	Hliníkové dveře komaxit vstupní U=1,2,prosklené neprůhledným,kování dle pož.zprávy-předběžná cena	m2	2,60	11 500,00	29 900,00
82	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 143,78	3,00	3 431,33
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				117 808,85
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
83	R-položka	Vnitřní okenní žaluzie - předběžná cena	m2	79,80	300,00	23 940,00
84	R-položka	Okenní síť proti hmyzu - předběžná cena	m2	7,98	600,00	4 788,00
85	R-položka	Plastová okna /osazení,montáž dodávka,kování parotěsná páska, Uw = 0,75/ předběžná cena	m2	92,13	3 450,00	317 841,60
86	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 465,70	3,00	10 397,09
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				356 966,69
Díl:	783	Nátěry				
87	783221112U00	Nátěr syntet KDK s UV filtrem 1a+1z+2e	m2	0,96	100,00	96,00
88	783522212U00	Nátěr synt klempíř s UV filtrem 1r+1z+2e	m2	64,61	100,00	6 461,40
89	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	0,96	100,00	96,00
Celkem za		783 Nátěry				6 653,40
Díl:	784	Malby				
90	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	88,20	50,00	4 410,00
Celkem za		784 Malby				4 410,00
Díl:	M11	Hromosvody				
91	11	Dtz stavajícího hromosvodu,mtz+d nového hromosvodu revize uzemnění a hromosvodu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		M11 Hromosvody				5 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
92	R-položka	Mtz zvonků vč.dodávky nového zvonku + el. vrátný+ dom telefon - předběžná cena	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
93	R-položka	Výměna stavajících venkovních svítidel	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
94	R-položka	Dtz nefunkčního el.vedení,uložení fukčních rozvodů do chrániček a zdíva-předběžná cena	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				15 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,39	50,00	2 419,37
96	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,39	50,00	2 419,37
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	435,49	10,00	4 354,87
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	48,39	50,00	2 419,37
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	387,10	10,00	3 871,00
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	48,39	200,00	9 677,50

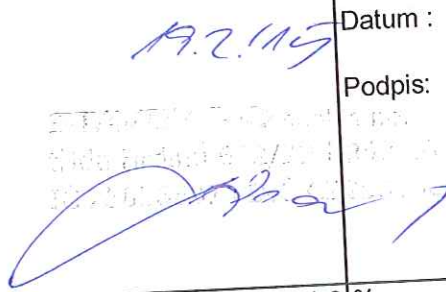
rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 161,49

ROZPOČET

Rozpočet	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		JKSO
Objekt			SKP
02	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ST13-19-1	ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520		Náklady na m.j.
Projektant	STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OBEC LIBINA		Zakázkové číslo
Dodavatel	STAVBY RIO		Počet listů
Rozpočtoval			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	20 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		20 000 Kč
DPH	21,0 %		4 200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 200 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 02 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Rozpočet : VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet


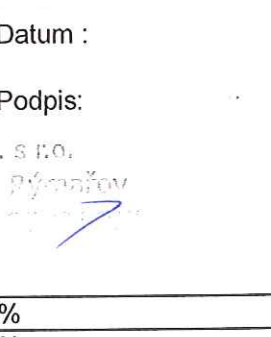
Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet:
Objekt :	02 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	9911	Zařízení staveniště	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
2	9912	Inženýská činnost kompletační	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	991 Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00

ROZPOČET

Rozpočet	13-19-1-2	OKAPOVÝ CHODNÍK ,VENKOVNÍ S	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	OBJEKT ZŠ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
ST13-19-1	ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520		Náklady na m.j.	0
Projektant	STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.			
Objednatel	OBEC LIBINA			
Dodavatel	STAVBY RIO		Zakázkové číslo	2011-74
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	57 592	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 524	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	66 116	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	66 116	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	66 116		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
 T. Václavík spol. s r.o. Přemyslov		 P. Pýmařov		
Základ pro DPH		21,0 %	66 116 Kč	
DPH		21,0 %	13 884 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				80 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet : 13-19-1-2
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ	OKAPOVÝ CHODNÍK ,VENKOVNÍ SCH

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 006	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 104	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 009	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 233	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	480	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 445	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 682	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 410	0	0	0
783 Nátěry	0	431	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	316	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 592	8 524	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			66 116	0
Oborová přírážka			66 116	0
Přesun stavebních kapacit			66 116	0
Mimostaveništní doprava			66 116	0
Zařízení staveniště		0,0	66 116	0
Provoz investora			66 116	0
Kompletační činnost (IČD)			66 116	0
Rezerva rozpočtu			66 116	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1-2
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ	OKAPOVÝ CHODNÍK ,VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokládaného kamenem v místě schodiště:1,5*1/2*1,2	m3	0,90 0,90	1 000,00	900,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 severní+západní+jížní-okap:28,785*0,25 základy pod schodiště:2*0,2*0,6*2 pod dlažbu v místě schodiště:1,5*1*0,2	m3	7,98 7,20 0,48 0,30	800,00	6 380,96
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	7,98	250,00	1 994,05
4	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m v místě schodiště:1,5*1/2*1,2	m3	0,90 0,90	450,00	405,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 7,9762+0,9	m3	8,88 8,88	300,00	2 662,86
6	R-položka	Poplatek za skládku	m3	8,88	300,00	2 662,86
	Celkem za	1 Zemní práce				15 005,73
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	279361821U00	Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505	t	0,01	20 000,00	200,00
8	274272120RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem B20 2*0,4*2+2*0,6/2*2	m2	2,80 2,80	680,00	1 904,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 104,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	434121416R00	Osazení žeb. stupňů na schodnice, drsných 1,5*7	m	10,50 10,50	100,00	1 050,00
10	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti 1,5*5	m	7,50 7,50	730,00	5 475,00
11	593723000.A	Stupeň schod. z vibrolisovaného betonu přírodní nášlapná a pohledová strana upravena trýskáním ztrátě1%:14*1,01	kus	14,14 14,14	600,00	8 484,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 009,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek rampa:5	m2	5,00 5,00	50,00	250,00
13	614472420R00	Oprava beton.konstr.plochy do 0,25 m2 tl.20 mm	kus	20,00	100,00	2 000,00
14	622473104R00	Reprofilace betonu tmelem tl.4 mm rampa:5	m2	5,00 5,00	200,00	1 000,00
15	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) 2,5*1,5*0,125	m3	0,47 0,47	1 800,00	843,84
16	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,47	200,00	93,76
17	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm 2,5*1,5*0,0044	t	0,02 0,02	20 000,00	330,00
18	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující pod schodiště:2*0,8/2*1,1	m3	0,88 0,88	600,00	528,00
19	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm severní+západní+jížní-okap:28,875 pod dlažbu v místě schodiště:1,5*1	m2	30,38 28,88 1,50	250,00	7 593,75
20	637111112U00	Okapový chodník štěrkopísek tl 15cm okap:28,875 pod dlažbu v místě schodiště:1,5*1	m2	30,38 28,88 1,50	250,00	7 593,75
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 233,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	6,00	80,00	480,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1-2
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ	OKAPOVÝ CHODNÍK ,VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,2*5		6,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				480,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,22	200,00	4 444,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 444,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				
23	711482020R00	Izolační systém nopová folie, svisle	m2	30,68	173,50	5 322,11
		okap chodník:57,75*0,5		28,88		
		v místě schodiště:1,5*1,2		1,80		
24	711140012RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x oxid. afalt. pás 40 mineral V 60 S 40	m2	0,90	400,00	360,00
		v místě schodiště:1,5*0,6		0,90		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 682,11
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767162130R00	Montáž zábradlí rovného z profilů do zdiva do 45kg	m	11,50	50,00	575,00
26	spec	Zábradlí schodišťové z tr.jackl 50/25/4	kg	43,01	40,00	1 720,40
		11,5*3,4*1,1		43,01		
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	22,95	5,00	114,77
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 410,17
Díl:	783	Nátěry				
28	783221112U00	Nátěr syntet s UV filtrem 1a+1z+2e	m2	1,73	250,00	431,25
		schod zábradlí:11,5*(0,05+0,025)*2		1,73		
	Celkem za	783 Nátěry				431,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	50,00	33,60
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,05	10,00	60,48
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	50,00	33,60
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,38	10,00	53,76
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	200,00	134,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				315,84

Rozpočet stavby

Datum: 17.2.2015

Stavba : ST13-19-2

ZATEPLENÍ ZS LIBINA C.P.520 - 2015

Objednatel : Obec Libina
Libina 523

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : STAVBY RIO, spol. s r.o.
Tř. Hrdinů 29
Rýmařov

IČO : 25826697
DIČ : CZ25826697

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		498 355,00
DPH	21 %		104 655,00
Cena celkem za stavbu			603 010

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	D1.4.a - Kotelna na tuhá paliva	455 098	0	376 114	78 984	75,5
2	D1.4.b - Výměna radiátorů ÚT	129 761	0	107 241	22 521	21,5
3	Vedlejší rozpočtové náklady	18 150	0	15 000	3 150	3,0
Celkem za stavbu		603 010	0	498 355	104 655	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	1 Kotelna na tuhá paliva	455 098	0	376 114	78 984	75,5
2	1 Výměna radiátorů ÚT	129 761	0	107 241	22 521	21,5
3	1 Vedlejší rozpočtové náklady	18 150	0	15 000	3 150	3,0
Celkem za stavbu		603 010	0	498 355	104 655	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	Zemní práce	0,4	2 100	0	0	0	0
	Základy a zvláštní zakládání	0,1	500	0	0	0	0
15	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,1	500	0	0	0	0
11	Upravy povrchů vnitřní	0,1	300	0	0	0	0
13	Podlahy a podlahové konstrukce	0,2	1 200	0	0	0	0
11	Izolace proti vodě	0,2	0	1 200	0	0	0
13	Izolace tepelné	1,0	0	4 862	0	0	0
21	Vnitřní kanalizace	0,5	0	2 490	0	0	0
22	Vnitřní vodovod	0,7	0	3 609	0	0	0
25	Zařizovací předměty	0,0	0	124	0	0	0
30	Ústřední vytápění	34,7	0	173 020	0	0	0
31	Kotelny	28,2	0	140 668	0	0	0

732	Strojovny	1,9	0	9 360	0	0	0
733	Rozvod potrubí	2,2	0	10 912	0	0	0
734	Armatury	8,0	0	39 745	0	0	0
735	Otopná tělesa	14,5	0	72 097	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	2,8	0	13 750	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,8	0	3 840	0	0	0
783	Nátěry	0,2	0	875	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,4	2 003	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	200	0	0	0	0
991	Vedlejší rozpočtové náklady	3,0	15 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	21 803	476 552	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

ROZPOČET

Rozpočet	1	Kotelna na tuhá paliva	JKSO	
Objekt			SKP	
1		D1.4.a - Kotelna na tuhá paliva	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ST13-19-2		ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Náklady na m.j.	0
Projektant		STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Libina		
Dodavatel		STAVBY RIO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 803	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	369 311	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	376 114	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	376 114	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	376 114	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	376 114 Kč
DPH			21,0 %	78 984 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				455 098 Kč

Poznámka :

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet : 1
Objekt :	1 D1.4.a - Kotelna na tuhá paliva	Kotelna na tuhá paliva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 100	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	500	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	500	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	300	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 003	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	200	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 200	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	4 862	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	2 490	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	3 609	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	124	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	165 690	0	0	0
731 Kotelny	0	140 668	0	0	0
732 Strojovny	0	9 360	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	10 912	0	0	0
734 Armatury	0	11 431	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 750	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	3 840	0	0	0
783 Nátěry	0	875	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 803	369 311	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet: 1
Objekt :	1 D1.4.a - Kotelna na tuhá paliva	Kotelna na tuhá paliva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	1,50	500,00	750,00
2	161101101R00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 2,5M	M3	1,50	100,00	150,00
3	162701105R00	VODOROV.PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1-4 10KM	M3	1,50	100,00	150,00
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,00	500,00	500,00
5	175101209R00	PŘÍPLATEK ZA PROHOZENÍ SYPANINY	M3	1,00	100,00	100,00
6	R2	POPLATEK ZA SKLADKU-VYKOPEK	M3	1,50	300,00	450,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 100,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,20	2 500,00	500,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				500,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
8	451573111R00	LOŽE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				500,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	612423531R00	OMÍTKA RÝH VE STĚN.š.15cm,MV,ŠTUKOV	M2	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				300,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,40	3 000,00	1 200,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	0,50	1 000,00	500,00
12	974042565R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x20 cm	m	10,00	50,00	500,00
13	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	1,76	50,00	88,00
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,28	10,00	52,80
15	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	1,76	50,00	88,00
16	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	35,20	5,00	176,00
17	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	1,76	50,00	88,00
18	979990001R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI	T	1,76	290,00	510,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 003,20
Díl: 97		Prorážení otvorů				
19	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín:	m2	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				200,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
20	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	12,00	100,00	1 200,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 200,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
21	7131010	Montáž izolačních skruží na potrubí	m	20,00	25,00	500,00
22	R	ODTAH SPALIN OD KOTLE D 200	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
23	SPEC.	IZOLACE POTRUBÍ DN 40	M	30,00	12,50	375,00
24	SPEC.	IZOLACE POTRUBÍ DN 25	M	5,00	9,00	45,00
25	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	44,20	10,00	442,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 862,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
26	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,00	600,00	600,00
27	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	8,00	219,00	1 752,00
28	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	50,00	50,00
29	721290112R00	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL	M	8,00	11,00	88,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 490,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet: 1
Objekt :	1 D1.4.a - Kotelna na tuhá paliva	Kotelna na tuhá paliva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
30	722131935R00	PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ	KUS	1,00	550,00	550,00
31	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20+izolace	m	12,00	169,00	2 028,00
32	722190401R00	VYVEDENÍ VÝPUSTEK DN 15	KUS	1,00	55,00	55,00
33	722262221U00	Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm	kus	1,00	480,00	480,00
34	722290234R00	PROPLACH A DEZINFEKCE DN 80	M	12,00	14,00	168,00
35	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	32,81	10,00	328,10
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				3 609,10
Díl: 725		Zařizovací předměty				
36	725860182R00	Sífon odpadní HL, DN 50	kus	1,00	124,00	124,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				124,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
37	0904 00	HZS-NEPREDVIDATELNE PRACE, DEMONTAZE	HOD	50,00	200,00	10 000,00
38	904 R02	HZS-zkousky v rámci montaz.praci TOPNÁ ZKOUŠKA	HOD	24,00	180,00	4 320,00
39	905 R01	HZS-vyvazeni soustavy, serizeni	jednot	1,00	5 000,00	5 000,00
40	907 R00	HZS-ZEDNICKE VYPOMOCI	HOD	35,00	250,00	8 750,00
41	R	ELEKTROINSTALACE+MaR NADŘAZENÁ REGULACE KOTLE	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
42	R	KOMIN TRIPLAST FASÁDNÍ D200 NEREZ-15m DODÁVKA + MONTÁŽ	soubor	1,00	94 850,00	94 850,00
43	SPEC.	KABINETOVA UPRAVA VODY	soubor	1,00	12 770,00	12 770,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				165 690,00
Díl: 731		Kotelny				
44	731100832R00	Demontáž kotle litinového a kouřovodu	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
45	731249116R00	Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
46	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,00	20,00	100,00
47	R	ODPOPELŇOVAC 80L	soubor	1,00		
48	R	AUTOMATICKÉ ZAPALOVÁNÍ	soubor	1,00		
49	R	KOTEL NA TUHÁ PALIVA, AUTOMATICKÝ S PODAVACEM 49kW	M	1,00	118 780,00	118 780,00
50	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1 278,80	10,00	12 788,00
	Celkem za	731 Kotelny				140 668,00
Díl: 732		Strojovny				
51	732331617U00	Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat M 80l	soubor	1,00	2 299,00	2 299,00
52	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00	250,00	250,00
53	R	OCHRANA KOTLE PROTI NÍZKOTEPLTNÍ KOROZI DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	2 426,00	2 426,00
54	SPEC.	OBĚHOVÉ ČERPADLO 32-60, SAMOREGULOVACÍ	soubor	1,00	4 385,00	4 385,00
	Celkem za	732 Strojovny				9 360,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
55	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	5,00	143,00	715,00
56	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	30,00	199,00	5 970,00
57	733190107R00	TLAK.ZKOUŠKA POTRUBÍ DN 40	M	35,00	5,00	175,00
58	733193944R00	Oprava-zaslepení potrubí , ODPOJENI	soubor	2,00	550,00	1 100,00
59	733194917R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí,DN40-PROPOJ	kus	2,00	980,00	1 960,00
60	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	99,20	10,00	992,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				10 912,00
Díl: 734		Armatury				
61	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,00	139,00	278,00
62	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,00	139,00	139,00

rozpočet

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet: 1
Objekt :	1 D1.4.a - Kotelna na tuhá paliva	Kotelna na tuhá paliva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	1,00	190,00	190,00
64	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	3,00	371,00	1 113,00
65	734209117RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4 včetně filtru	kus	1,00	369,00	369,00
66	734211111R00	VENT ODVZDUŠOVACÍ MINIVAL NADOBKA ON 50	KUS	3,00	310,00	930,00
67	734251223U00	Ventil pojist roh R140 G1 1,8 bar	kus	2,00	575,00	1 150,00
68	734256451	MONTÁŽ NÁVARKŮ	KUS	5,00	55,00	275,00
69	734291113R00	KOHOUT PLNÍČÍ VYPOUŠTĚČÍ G 1/2	KUS	4,00	110,00	440,00
70	734295114R00	Směšovací armatury trojcestné Mix AP	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
71	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdrům typ 160	kus	4,00	180,00	720,00
72	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160	kus	1,00	655,00	655,00
73	734494213R00	NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM	KUS	5,00	8,00	40,00
74	SPEC.	SERVOVOPON	KUS	1,00	2 982,00	2 982,00
	Celkem za	734 Armatury				11 431,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
75	735191910R00	NAPUŠTĚNÍ VODY DO SYSTÉMU OTOPI. TĚL.	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
76	767995101R00	KDK MTZ ATYPU HMOTNOST CELKEM -5KG	KG	25,00	150,00	3 750,00
77	R	ÚPRAVA POTRUBÍ VETRANÍ KOTELNY	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
78	spec.	OCELOVÉ UPEVNOVACÍ PRVKY	KG	25,00	250,00	6 250,00
79	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	125,00	10,00	1 250,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				13 750,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
80	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	12,00	20,00	240,00
81	777212906U00	Oprava podlaha Epoxy 1330 tl -10mm	m2	12,00	300,00	3 600,00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				3 840,00
Díl:	783	Nátěry				
82	783424340R00	NÁTĚR SYNT.POTR. Z+2+1E DN 50mm	M	35,00	25,00	875,00
	Celkem za	783 Nátěry				875,00

ROZPOČET

Rozpočet	1	Výměna radiátorů ÚT	JKSO	
Objekt			SKP	
2		D1.4.b - Výměna radiátorů ÚT	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ST13-19-2		ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Náklady na m.j.	0
Projektant		STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Libina		
Dodavatel		STAVBY RIO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	102 411	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	102 411	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	4 830	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	107 241	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	107 241	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	107 241 Kč
DPH	21,0 %	22 521 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		129 762 Kč

Poznámka :

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet : 1
Objekt :	2 D1.4.b - Výměna radiátorů ÚT	Výměna radiátorů ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0	2 500	0	0	4 830
734 Armatury	0	28 314	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	71 597	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	102 411	0	0	4 830

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

rozpočet

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet: 1
Objekt :	2 D1.4.b - Výměna radiátorů ÚT	Výměna radiátorů ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	730	Ústřední vytápění				
1	930000018	Koordinace profesí	H	10,00	250,00	2 500,00
2	904 R02	HZS-zkousky v rámci montaz.praci TOPNÁ ZKOUŠKA	HOD	6,00	180,00	1 080,00
3	907 R00	HZS-ZEDNICKE VYPOMOCI, DEMONTÁŽE	HOD	15,00	250,00	3 750,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				7 330,00
Díl:	734	Armatury				
4	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 oprava	kus	52,00	150,00	7 800,00
5	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	40,00	50,00	2 000,00
6	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů	kus	40,00	60,00	2 400,00
7	734261213R00	Šroubení radiátorové, G 1/2 uzavíratelné	kus	20,00	185,00	3 700,00
8	734291931R00	Zpětná montáž šroubení do G 1/2	kus	6,00	80,00	480,00
9	734291951R00	MTŽ HLAVIC RUČ/TERM.OVLÁDÁNÍ	KUS	26,00	30,00	780,00
10	SPEC.	termostatická hlavice pro veřejné prostory	KUS	26,00	190,00	4 940,00
11	SPEC.	radiátorový ventil termostatický DN 15	KUS	26,00	140,00	3 640,00
12	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	257,40	10,00	2 574,00
	Celkem za	734 Armatury				28 314,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
13	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	26,00	55,00	1 430,00
14	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	26,00	25,00	650,00
15	735111810R00	Demontáž těles otopných článkových	m2	12,00	105,00	1 260,00
16	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	7,00	75,00	525,00
17	735156542R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21R 554/ 600	kus	1,00	1 047,00	1 047,00
18	735156547R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21R 554/1200	kus	1,00	1 539,00	1 539,00
19	735156549R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21R 554/1600	kus	11,00	1 868,00	20 548,00
20	735156644R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22R 554/ 800	kus	1,00	1 349,00	1 349,00
21	735156647R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22R 554/1200	kus	1,00	1 760,00	1 760,00
22	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22R 554/1400	kus	4,00	1 963,00	7 852,00
23	735156649R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22R 554/1600	kus	1,00	2 168,00	2 168,00
24	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	26,00	950,00	24 700,00
25	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	26,00	10,00	260,00
26	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	650,88	10,00	6 508,80
	Celkem za	735 Otopná tělesa				71 596,80

ROZPOČET

Rozpočet	1	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
3		Vedlejší rozpočtové náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ST13-19-2		ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Náklady na m.j.	0
Projektant		STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Libina		
Dodavatel		STAVBY RIO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	15 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	15 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	15 000 Kč
DPH		21,0 %	3 150 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	18 150 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet : 1
Objekt :	3 Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Vedlejší rozpočtové náklady	15 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

rozpočet

Stavba :	ST13-19-2 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520 - 2015	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	9911	Zařízení staveniště				
2	9912	Inženýská činnost kompletační	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
			soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	991 Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	13-19-1	DODATEK Č. 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
ST13-19-1	ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520		Náklady na m.j.	0
Projektant	STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	STAVTES STAVEBNĚ-TECHNICKÁ SPOL. S R.O.			
Objednatel	OBEC LIBINA			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-74
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	14 797	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	14 797	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	14 797	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	14 797	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	14 797 Kč
DPH	21,0 %	3 107 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		17 904 Kč

Poznámka :

Stavba : ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520
 Objekt : 01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ

Rozpočet : 13-19-1
 DODATEK Č. 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	14 797	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 797	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			14 797	0
Oborová přírážka			14 797	0
Přesun stavebních kapacit			14 797	0
Mimostaveništní doprava			14 797	0
Zařízení staveniště			14 797	0
Provoz investora			14 797	0
Kompletační činnost (IČD)			14 797	0
Rezerva rozpočtu			14 797	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ST13-19-1 ZATEPLENÍ ZŠ LIBINA Č.P.520	Rozpočet: 13-19-1
Objekt :	01 OBJEKT ZŠ - ZATEPLENÍ	DODATEK Č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622142001U00	Potažení vně stěna sklovi síť +tmel včetně dodávky potřebného materiálu	m2	147,97	100,00	14 797,00
		kolem celé budovy na výšku 2m:(0,14+6,95+13,55+6,95+0,14)*2		55,46		
		-2*1*2		-4,00		
		-1,5*2		-3,00		
		27,73*2		55,46		
		-0,5*0,3*2		-0,30		
		-1*2*2		-4,00		
		(0,1+0,14+12,45+3+0,14)*2		31,66		
		-2*1*3		-6,00		
		(3,1+12,63+0,1)*2		31,66		
		-2*1*4		-8,00		
		-0,97*1		-0,97		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				14 797,00

Zateplení ZS Libina

HARMONOGRAM PRACÍ KVĚTEN - ČERVENEC 2015

Týden	4.5.	11.5.	18.5.	25.5.	1.6.	8.6.	15.6.	22.6.	29.6.	6.7.	13.7.	20.7.	27.7.
Práce													
Předání staveniště													
Zateplení fasády													
Výměna oken a dveří													
Zateplení půdy													
Ostatní k zateplení													
Dodatek č.1													
Okapový chodník, venkovní schody													
Kotelna na tuhá paliva													
Výměna radiátorů													
Ostatní náklady													
Předání díla													

STAVBAČSKÝ ÚSTŘEDÍ S.R.O.
 Ing. Petr Janda /2015/ P. Janda
 15.6.2015
