

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052348 (ORG 2891)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201601701/0266/16/VHS a DS

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
**Zastoupený:** K podpisu této smlouvy jsou na základě mandátní smlouvy  
 č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 zmocněny  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
 Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno  
 zastoupené:  
 Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva  
 K podpisu smlouvy je oprávněn:  
 Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,  
 na základě zmocnění ze dne 15. 12. 2015  
 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
 č.ú. 111246222 / 0800  
 Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
 Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno  
 faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278  
 Pověření zaměstnanci:  
 vedoucí oddělení investic a oprav Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776,  
 e-mail: pciganek@bvk.cz  
 technický dozor stavby ing. Libor Krejčík, tel. 602 442 833,  
 e-mail: lkrejcik@bvk.cz

dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Sdružení Francouzská – rekonstrukce kanalizace  
 Se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
 Zastoupené IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 01. 07. 2015  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
 číslo účtu: 117785163/0300

Vedoucí společník IMOS Brno, a.s.  
 sídlo firmy Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  
 Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
**IČO:** 25 32 22 57  
**DIČ:** CZ25322257

Druhý společník                    D.I.S., spol. s r.o.  
Sídlo firmy                        Brno - Královo Pole, Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650  
zastoupený                        Ing. Richardem Langem, jednatelem  
IČO:                                 469 75 616  
DIČ:                                 CZ46975616

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu VHS a DS Brno  
stavbyvedoucí Ing. František Navrátil, tel: 602 756 098,  
e-mail: navratilf@imosbrno.eu, fax: 548 129 390

(dále jen zhotovitel)

## **II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla, tj. stavby

### **„Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.**

Součástí předmětu díla je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION)

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. v prosinci 2014, zakázkové číslo 1384813-16.
3. Místem plnění je ulice Francouzská, Brno, k. ú. Zábrdovice. Stavbou budou dotčeny ulice Francouzská, Černopolní a Přadlácká v Brně.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
5. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 11. 04. 2016.

## **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v termínu                    1. 6. 2016

2. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na objektech SO 01 Stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Přeložky sloupů VO v rámci I. etapy (konkrétně v úseku Příční – Černopolní) v termínu  
**1. 6. 2016**

dokončit práce na objektech SO 01 Stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Přeložky sloupů VO v rámci I. etapy (konkrétně v úseku Příční – Černopolní) v termínu  
**19. 10. 2016**

3. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Přeložky sloupů VO v rámci I. etapy (konkrétně v úseku Příční – Černopolní) činí **141 kalendářních dní**.

4. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na objektech SO 01 Stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Přeložky sloupů VO v rámci v rámci I. etapy (konkrétně v úseku Černopolní – Hvězdova) a II. etapy (úsek Hvězdova – Cejl) v termínu  
**16. 1. 2017**

dokončit práce na objektech SO 01 Stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Přeložky sloupů VO v rámci v rámci I. etapy (konkrétně v úseku Černopolní – Hvězdova) a II. etapy (úsek Hvězdova – Cejl) v termínu  
**30. 9. 2017**

5. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 05 Přeložky sloupů VO v rámci v rámci I. etapy (konkrétně v úseku Černopolní – Hvězdova) a II. etapy (úsek Hvězdova – Cejl) činí **258 kalendářních dní**.

6. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný a předložený časový a finanční harmonogram prací obsahuje věcnou návaznost a reálnou délku provádění jednotlivých stavebních objektů díla i koordinovaných staveb jiných investorů a současně zohledňuje možný vliv klimatických podmínek a ročních období na realizaci prací. Časový a finanční harmonogram zpracovaný v podrobnostech pro jednotlivé stavební objekty je nedílnou součástí této smlouvy.

7. V případě zpoždění prací oproti schválenému časovému a finančnímu harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

#### IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

2. Celková cena bez DPH **47 973 954,- Kč**

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
  - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám u daně z přidané hodnoty,
  - v případě dodatečných stavebních prací zadáných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách, jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
5. V případě, že dojde v průběhu realizace díla ke vzniku dodatečných stavebních prací oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební práce předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky v cenové úrovni odpovídající nabídce.
6. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.2 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

## **V. Platební podmínky**

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.
2. Termín 1. dílčího plnění: 15. 07. 2016  
Termín 2. dílčího plnění: 15. 08. 2016  
Termín 3. dílčího plnění: 15. 09. 2016  
Termín 4. dílčího plnění: 15. 10. 2016  
Termín 5. dílčího plnění: 15. 11. 2016  
Termín 6. dílčího plnění: 15. 12. 2016  
Termín 7. dílčího plnění: 15. 01. 2017  
Termín 8. dílčího plnění: 15. 02. 2017  
Termín 9. dílčího plnění: 15. 03. 2017  
Termín 10. dílčího plnění: 15. 04. 2017  
Termín 11. dílčího plnění: 15. 05. 2017  
Termín 12. dílčího plnění: 15. 06. 2017

Termín 13. dílčího plnění: 15. 07. 2017

Termín 14. dílčího plnění: 15. 08. 2017

Termín 15. dílčího plnění: 15. 09. 2017

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu zahájení stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží vždy od dne následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného dílčího plnění dle odst. 2.
4. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních před koncem fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele do 14 od konce uplynulého fakturačního období. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.
5. Konečná faktura bude doložena oboustranně odsouhlaseným a podepsaným zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
6. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
  - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
  - číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti faktury,
  - den uskutečnění zdanitelného plnění,
  - označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
  - označení díla,
  - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
  - fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
  - razítko a podpis oprávněné osoby,
  - na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
  - nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, Brno.
9. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

10. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude kryt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

## **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději v den zahájení prací (čl. III odst. 1 této smlouvy) spolu s projektem stavby ve dvou vyhotoveních. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla a na celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s příloženým časovým a finančním harmonogramem a podmínkami stavebních povolení umožní vstup do svého staveniště a realizaci prací na koordinovaných stavbách dalších investorů (uvedených v čl. VIII odst. 34 této smlouvy o dílo), které musí být provedeny před finální obnovou povrchů ulic.
6. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem a vyklizením zařízení staveniště.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy dokumentující provádění stavby.
3. Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky vodovodních přípojek, které bude potvrzovat provozní technik objednatele nad výkopem. Tabulky musí být kontrolovány provozem objednatele a uloženy společně se stavebním deníkem.
4. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru.

5. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickým dozorem stavby do stavebního deníku průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit technickým zástupcem objednatele.
6. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

### **VIII. Požadavky na způsob provádění díla**

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), kácení dřevin atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání.
3. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou.
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací.
6. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
7. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn., zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
9. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě

veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků nad rámec předaného staveniště je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
11. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být zaznamenány ihned po jejich realizaci.
13. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
16. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.

- 
17. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.
  18. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  19. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
  20. Zhotovitel zajistí případné povolení ke kácení dřevin.
  21. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup.
  22. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci provede na objednávku útvar správy a údržby Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
  23. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli vodovodní sítě (úsek správy a provozu vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
  24. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelem při předání staveniště. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování při provádění propojů vodovodních řadů.
  25. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné umístění orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur na vodovodu. Umístění orientačních tabulek je prováděno v souladu s §7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tabulky budou umístěny na nemovitostech v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle místních podmínek a s přihlédnutím k požadavkům vlastníka nemovitosti.
  26. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži vodovodu budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby. Školení pracovníků zhotovitele lze zajistit prostřednictvím provozovatele vodovodní sítě (Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., vodárenská sekce), jehož vybraní zaměstnanci jsou oprávněni ke školení dalších osob.

27. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.
28. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši 50 mil. Kč.
29. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
30. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně subdodávky.
31. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
32. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ o zahájení a plánovaném průběhu prací (uzavírkách).
33. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.
34. Zhotovitel bude stavbu koordinovat se stavbami koordinujícími investorů. Jedná se o stavby:
- „Výměna STL a NTL plynovodu a přípojek“ (RWE GasNet, s.r.o.),
  - „Oprava komunikace Francouzská“ (Brněnské komunikace a.s.),
  - „Přestavba z páry na horkou vodu“ (Teplárny Brno, a.s.).

## **IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu**

1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

## **X. Předání díla**

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Následně svolá objednatel předávací a přejímací řízení.

- 
2. Zhotovitel je povinen doložit u přijímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
    - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré),
    - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
    - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
    - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
    - stavební deník,
    - tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě),
    - tabulky kanalizačních přípojek (3x v tištěné podobě),
    - geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD),
    - doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán).
  3. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
  4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání díla.
  5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání díla vyskytly.
  6. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

## **XI. Vady díla a záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

## **XII. Sankce, odstoupení od smlouvy**

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena vůči celkové ceně díla při vystavení konečné faktury.
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky (čl. V odst. 10 této smlouvy o dílo) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
6. V případě prodlení s předložením seznamu subdodavatelů ve lhůtách dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady majetkové či nemajetkové újmy. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti majetková či nemajetková újma, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
9. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
10. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů, nebo prodlení s plněním dohodnutého termínu dílčího plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy, v souladu s časovým a finančním harmonogramem, delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

11. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací nabídkovým rozpočtem stavebních objektů (nabídka zhotovitele ze dne 11.04.2016) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

### **XIII. Změny smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII odst. 6 této smlouvy. V případě plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/064 dne 10.5.2016.

V Brně dne 27.5.2016

V Brně dne 27-05-2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

  
I.

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
za kterou jedná  
Ing. Ladislav Haška  
generální ředitel

  
.....  

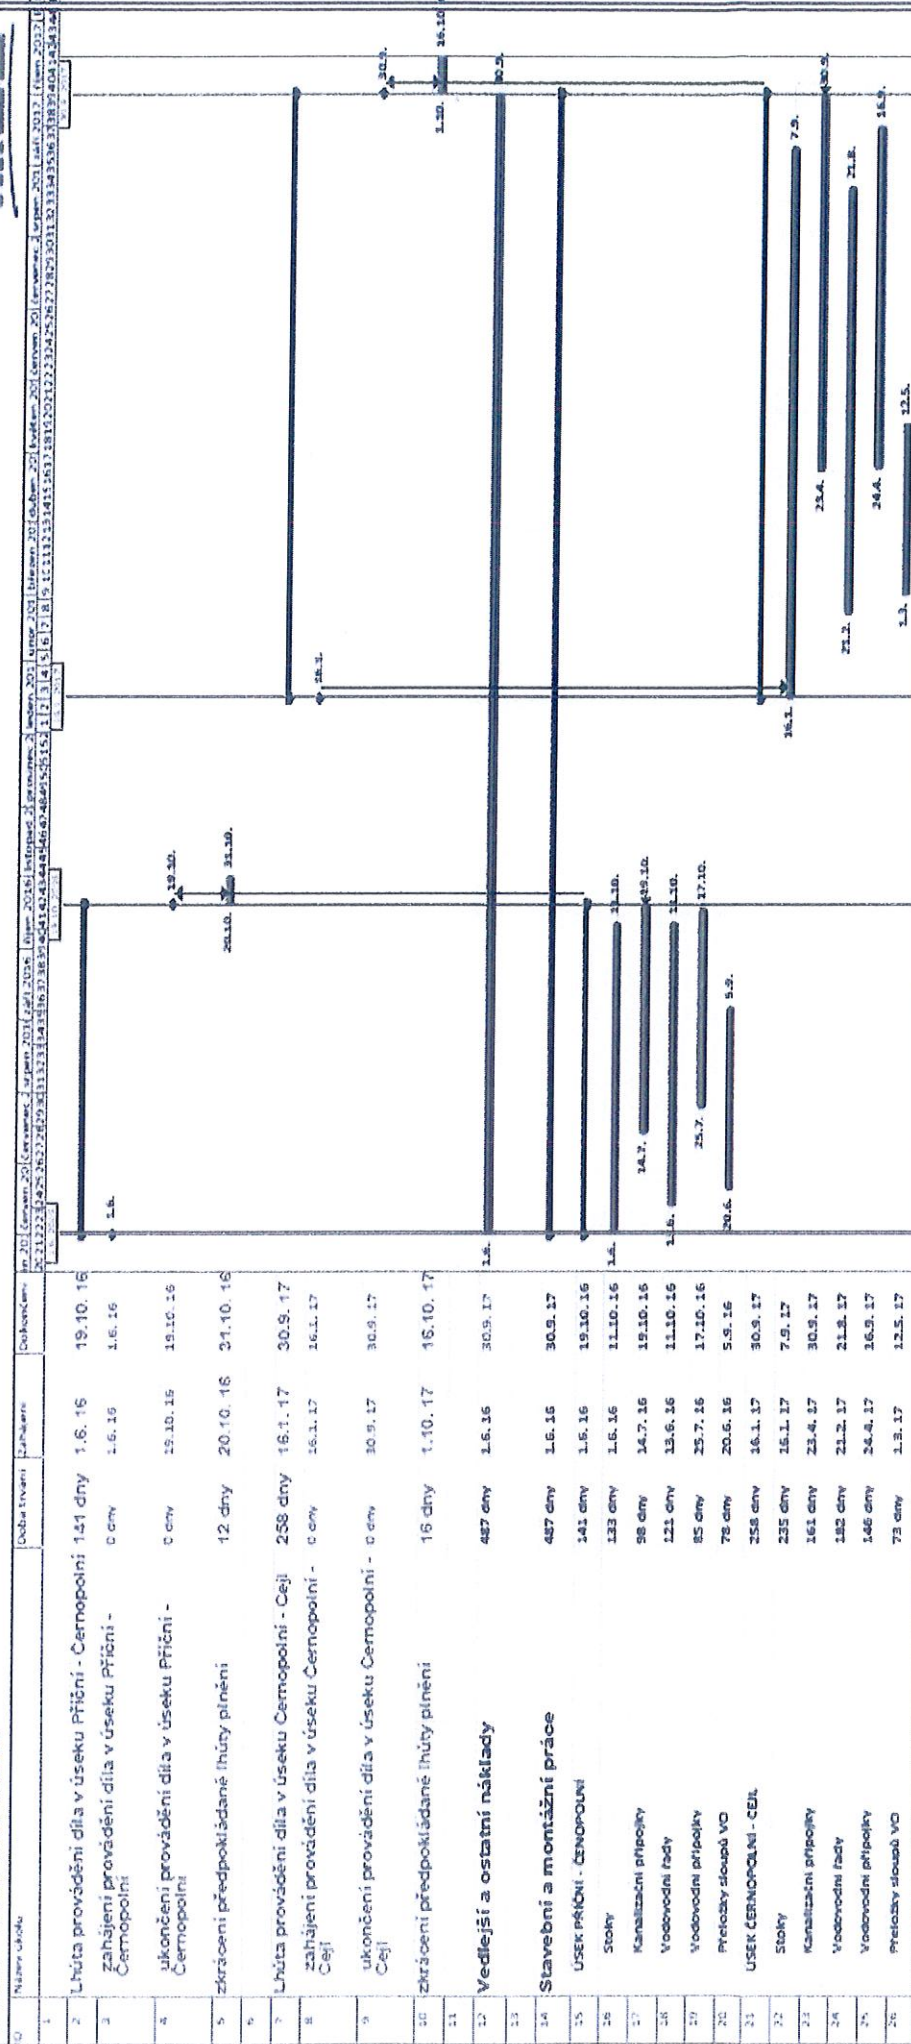

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva a generální ředitel

.....  
za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

.....  
za D. I. S. spol. s r.o.  
na základě plné moci ze dne 1. 7. 2015  
IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

# PŘÍLOHA č.1 - Časový a finanční harmonogram

Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
ČASOVÝ HARMONOGRAM



Datum : 27-05-2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Václavova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno

1.

Ing. Ladislav HAŠKA

generální ředitel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Datum :

27-05-2016

IMOS  
Ing. Robert SUCHÁNEK  
Ing. Robert Suchánek  
generální ředitel

dis IMOS

Ing. Robert SUCHÁNEK  
předseda představenstva  
společnosti IMOS Brno, a.s.

Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce :  
**" Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu "**

|                                   |  |               |
|-----------------------------------|--|---------------|
| CELKEM v Kč bez DPH a bez Rezervy |  | 47 973 954 Kč |
|-----------------------------------|--|---------------|

| Rok 2016 |   | 27 724 349 Kč |      |        |       |              |           |           |           |               |           |          |          |
|----------|---|---------------|------|--------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|
| Kvartál  |   | 0 Kč          |      |        |       | 6 263 655 Kč |           |           |           | 17 246 545 Kč |           |          |          |
| Měsíc    |   | Leden         | Únor | Březen | Duben | Květen       | Červen    | Červenec  | Spen      | Září          | Říjen     | Listopad | Prosinec |
| SO 01    |   |               |      |        |       |              | 2 761 487 | 2 209 190 | 2 209 190 | 2 209 190     | 1 656 892 |          |          |
| SO 02    |   |               |      |        |       |              | 1 547 468 | 1 934 335 | 1 547 468 | 1 547 468     | 1 160 601 |          |          |
| SO 03    |   |               |      |        |       |              | 878 588   | 1 098 235 | 878 588   | 878 588       | 658 941   |          |          |
| SO 04    |   |               |      |        |       |              | 547 897   | 547 897   | 684 872   | 547 897       | 410 923   |          |          |
| SO 05    |   |               |      |        |       |              | 139 743   | 139 743   | 139 743   | 174 679       | 104 807   |          |          |
| 90       |   |               |      |        |       |              | 388 472   | 277 480   | 110 992   | 110 992       | 221 984   |          |          |
| částka   | 0 | 0             | 0    | 0      | 0     | 0            | 6 263 655 | 6 206 880 | 5 570 852 | 5 468 814     | 4 214 148 | 0        | 0        |

| Rok 2017 |           | 20 249 605 Kč |           |           |           |              |           |           |           |              |       |          |          |
|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|----------|----------|
| Kvartál  |           | 4 721 422 Kč  |           |           |           | 8 710 972 Kč |           |           |           | 6 817 211 Kč |       |          |          |
| Měsíc    |           | Leden         | Únor      | Březen    | Duben     | Květen       | Červen    | Červenec  | Spen      | Září         | Říjen | Listopad | Prosinec |
| SO 01    |           | 562 578       | 787 610   | 1 125 157 | 1 687 735 | 1 687 735    | 1 687 735 | 1 462 704 | 1 125 157 | 1 125 157    |       |          |          |
| SO 02    |           | 196 975       | 275 765   | 393 950   | 590 925   | 590 925      | 590 925   | 512 135   | 393 950   | 393 950      |       |          |          |
| SO 03    |           | 136 462       | 191 047   | 272 925   | 327 509   | 409 387      | 409 387   | 354 802   | 327 509   | 300 217      |       |          |          |
| SO 04    |           | 63 672        | 89 141    | 101 876   | 152 814   | 191 017      | 191 017   | 191 017   | 165 548   | 127 345      |       |          |          |
| SO 05    |           | 8 064         | 11 290    | 12 903    | 16 129    | 19 354       | 24 193    | 24 193    | 24 193    | 20 967       |       |          |          |
| 90       |           | 223 639       | 178 911   | 89 456    | 44 728    | 44 728       | 44 728    | 44 728    | 44 728    | 178 911      |       |          |          |
| částka   | 1 191 391 | 1 533 765     | 1 996 266 | 2 819 840 | 2 943 147 | 2 947 985    | 2 589 579 | 2 081 085 | 2 146 547 | 0            | 0     | 0        | 0        |

Datum : 27 -05- 2016  
 Ing. Ladislav HAŠKA  
 generální ředitel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Datum : 27 -05- 2016  
 Ing. Robert SUCHÁNEK  
 předseda představenstva  
 společnosti IMOS Brno, a.s.

IMOS Brno, a.s.  
 Ing. Robert SUCHÁNEK  
 předseda představenstva  
 společnosti IMOS Brno, a.s.
